



**life
fluvial**

LIFE16 NAT/ES/000771



Acción A2. Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo- Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023)

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN



Abril 2019

LIFE 16/NAT/ES/000771

Acción A2. Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023)

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

INDUROT (UNIOVI)

Pilar García Manteca

María Fernández García

Mauro Sanna

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Pilar García Manteca

Jesús Valderrábano Luque

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Jorge Marquínez García

Este informe debe citarse como: García Manteca, P., Fernández García, M. & Sanna, M. (2019): *Acción A2: Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023). Desarrollo de las propuestas de actuación.* Informe realizado para el proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinadores: Pilar García Manteca y Jesús Valderrábano Luque. Director del proyecto: Jorge Marquínez García.

Recommended citation: García Manteca, P., Fernández García, M. & Sanna, M. (2019): *Acción A2: Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023). Desarrollo de las propuestas de actuación.* Report developed within the LIFE Fluvial project (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinators: Pilar García Manteca and Jesús Valderrábano Luque. Project director: Jorge Marquínez García.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ENCLAVE C2-01-01 ISLA FLUVIAL EN VEGADEO	2
3. ENCLAVE C2-02-01 MARGEN IZQUIERDA EN SAN TIRSO DE ABRES	5
4. ENCLAVE C2-02-02 MARGEN IZDA EN SAN TIRSO DE ABRES HASTA EL PUENTE	9
5. ENCLAVE C2-02-03 MARGEN DERECHA EN SAN TIRSO DE ABRES	13
6. ENCLAVES C2-03-01 Y C2-03-02 A PONTENOVA (BOULLOSO)	17
7. ENCLAVE C2-03-03 A PONTENOVA (PARQUE FLUVIAL)	21
8. ENCLAVE C2-04-01 ÁREA RECREATIVA FONDÓN (VILABOA-A PONTENOVA)	25
9. ENCLAVE C2-05-01 MEIRA (AGUAS ABAJO O PIÑEIRO)	27
10. ENCLAVE C2-05-02 MEIRA (AGUAS ARRIBA O PIÑEIRO)	31
11. ENCLAVE C2-06-01 RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN DERECHA)	35
12. ENCLAVE C2-06-02 RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN IZQUIERDA)	41
13. SÍNTESIS	47

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo forma parte del documento elaborado en el marco de la acción A2 *Planificación técnica de las acciones de conservación* titulado *Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023)* en el que se incluye la planificación técnica de la acción de conservación C2. Dicha acción consiste en el desarrollo de actuaciones que permitan el incremento de bosques aluviales (91E0*) y la mejora del grado de conservación de los bosques húmedos del hábitat 91E0*.

Con este anexo se pretende completar el contenido del proyecto técnico aportando información y cartografía detallada de las actuaciones a llevar a cabo de forma que ayude en la ejecución de los trabajos de los 12 enclaves de actuación a lo largo de unos 56 km de río sobre una superficie total de 11,3 ha.

Las actuaciones previstas son:

- Eliminación y control de especies exóticas invasoras.
- Retirada de árboles muertos
- Restauración forestal con planta típica del hábitat.

La densidad de la plantación será de 2.900 pies/ha y se realizará al azar. Las labores de realización serán con métodos manuales y se instalarán tubos protectores para evitar daños por fauna silvestre.

2. ENCLAVE C2-01-01 ISLA FLUVIAL EN VEGADEO

Este enclave de actuación tiene una superficie de 1019 m² y se van a llevar a cabo actuaciones a lo largo del año 2020, en dos fases, una en la primera mitad del año y otra en la segunda (Figura 1.).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 1), además en algunos sectores de la isla se requerirá de un desbroce y acondicionamiento del terreno para la posterior plantación.

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	1	-
Eliminación de <i>Bidens aurea</i>	1	-
Eliminación de <i>Crocosmia × crocosmiiflora</i>	-	300
Eliminación de <i>Zantedeschia aethiopica</i>	3	-

Tabla 1. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-01-01.


En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones de restauración siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero en las zonas acondicionadas y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas de cara a incrementar la superficie del hábitat 91E0*. Además, en la aliseda donde se retiró el árbol muerto se llevará a cabo una plantación de refuerzo en base a la información que se muestran en la Tabla 2. En total, se realizarán plantaciones en una superficie de 390 m²,

que constituye prácticamente un 38% de la superficie total del enclave, con un total de 95 pies.

FASE 2. AÑO 2020 (SEGUNDO SEMESTRE).						
Plantación	Superficie (m²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	317	23	55	5	5	5
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	73	3	-	-	-	-
TOTAL	390	26	55	5	5	5

Tabla 2. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-01-01.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 460 m², además con las plantaciones que se realizarán se producirá un incremento del mismo en 317 m².

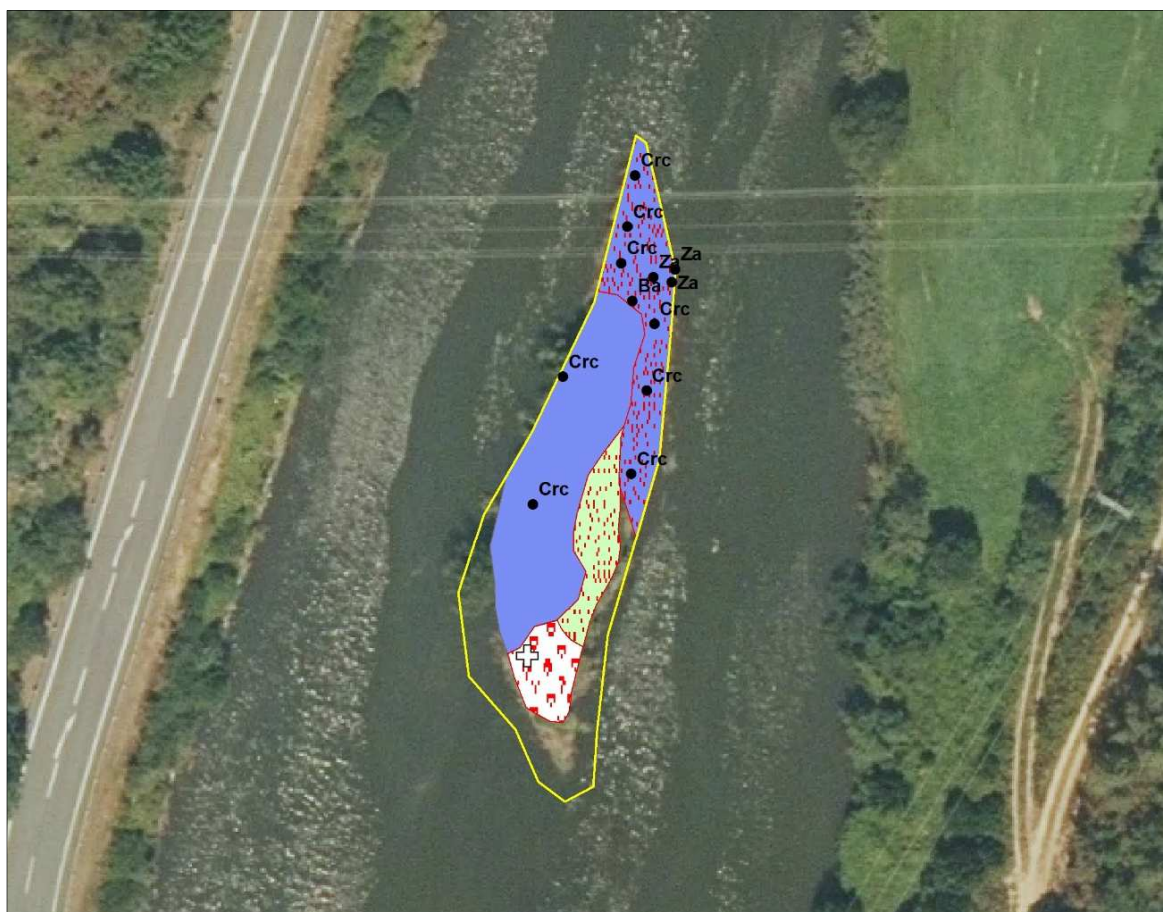

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-01-01.ISLA FLUVIAL EN VEGADEO

Actuaciones

91E0

-  Tala de muertos y plantación de refuerzo
-  Eliminación alóctonas
-  Eliminación de alóctonas y plantación de restauración
-  Desbroce y plantación de restauración

-  Eliminación alisos muertos
- Invasoras y alóctonas a eliminar
 - Ba- *Bidens aurea*
 - Crc- *Crocosmia × crocosmiiflora*
 - Za- *Zantedeschia aethiopica*

 Enclave actuación




Figura 1. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-01-01.

3. ENCLAVE C2-02-01 MARGEN IZQUIERDA EN SAN TIRSO DE ABRES

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por San Tirso de Abres aguas abajo del puente tiene una superficie de 10342 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la segunda mitad (Figura 2.).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 3), además en tres pequeños sectores del enclave se requerirá de un desbroce y acondicionamiento del terreno para poder llevar a cabo la posterior plantación.

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	23	-
Eliminación de <i>Acacia melanoxylon</i>	23	-
Eliminación de <i>Crocosmia × crocosmiiflora</i>	-	620
Eliminación de <i>Cyperus eragrostis</i>	2	-
Eliminación de <i>Delairea odorata</i>	-	8
Eliminación de <i>Ligustrum ovalifolium</i>	2	-
Eliminación de <i>Populus × canadensis</i>	6	-
Eliminación de <i>Rosa sp.</i>	1	-
Eliminación de <i>Tradescantia fluminensis</i>	-	20

Tabla 3. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-02-01.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus*

excelsior, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en: las zonas acondicionadas; los sectores con ausencia de vegetación riparia de alto porte; y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas, todo ello de cara a mejorar la continuidad longitudinal del bosque de ribera.

Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se talen alisos afectados por *Phytophthora alni*, se procederá a la reposición de los árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior* y *Acer pseudoplatanus*. En la Tabla 4 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie.

La totalidad de la superficie a plantar es de 8356 m², lo que supone un 81% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 780 pies.

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 286 m² repartidos en pequeños parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.

FASE 2. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	2454	178	427	36	36	36
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	5902	60	5	3	-	-
TOTAL	8356	238	432	39	36	36

Tabla 4. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-02-01.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 7371 m², además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento del mismo en 2740 m².

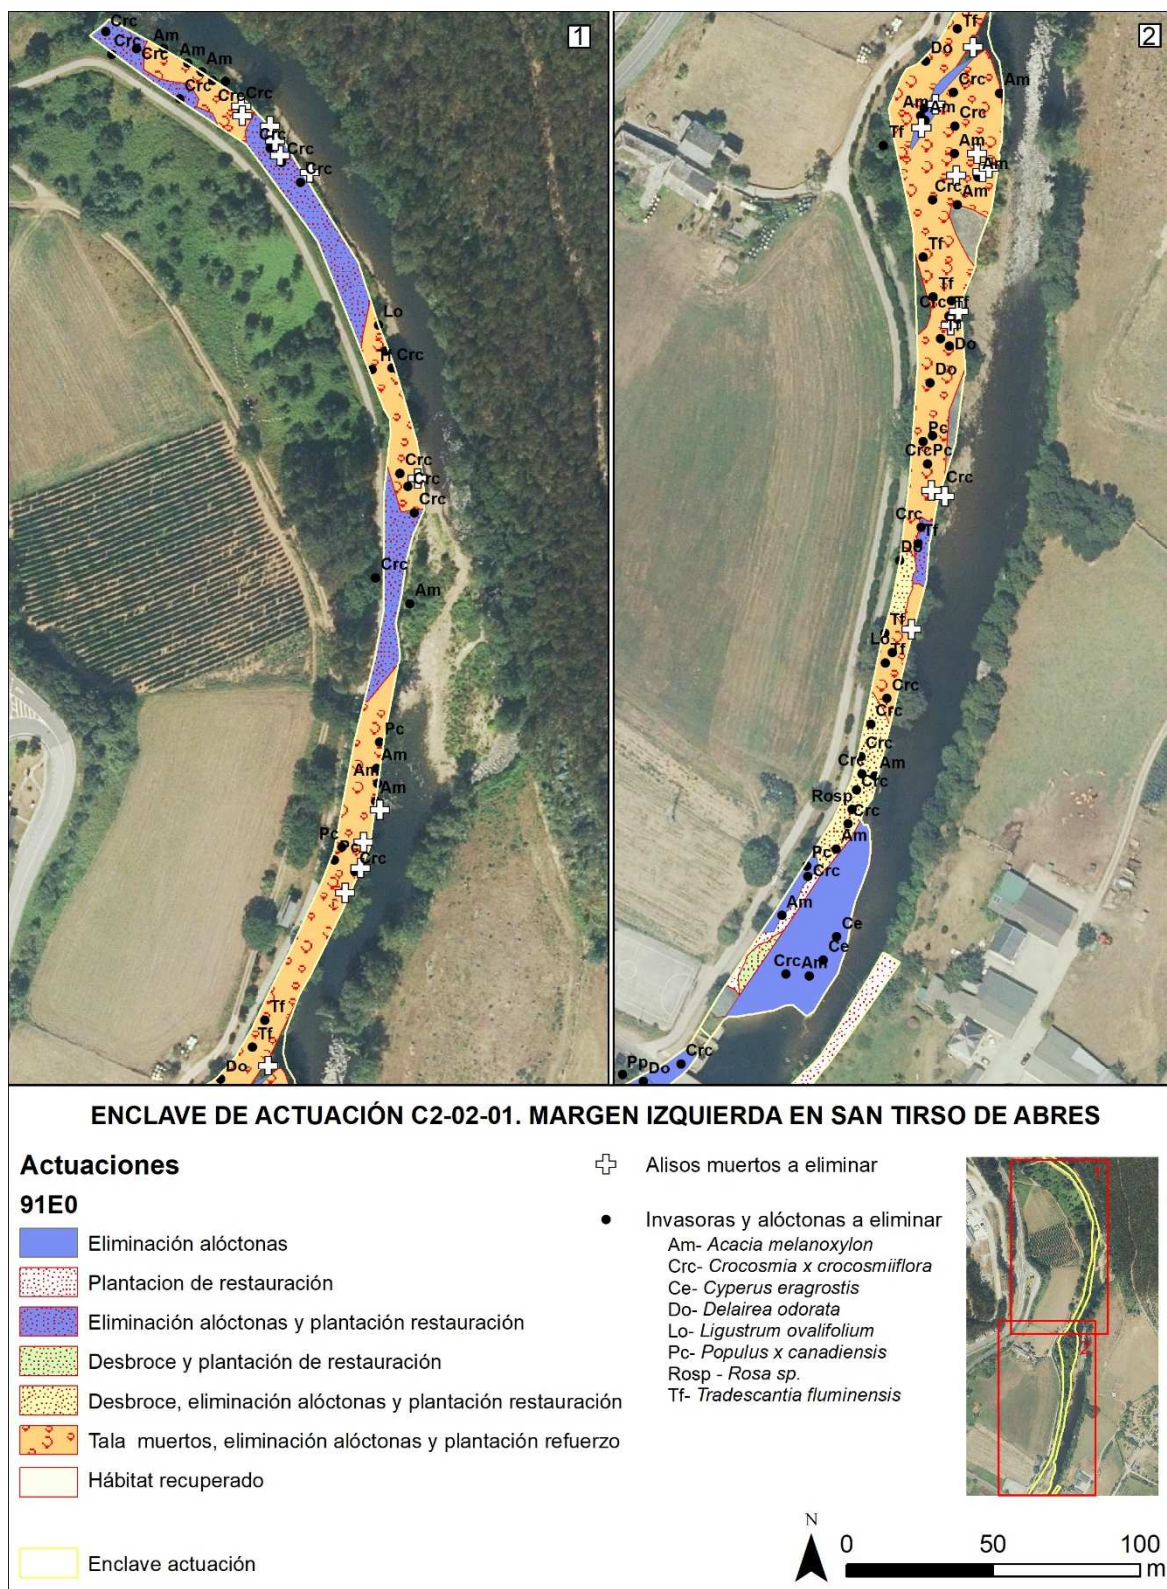


Figura 2. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-02-01.

4. ENCLAVE C2-02-02 MARGEN IZDA EN SAN TIRSO DE ABRES HASTA EL PUENTE

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por San Tirso de Abres aguas arriba del puente tiene una superficie de 8227 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la segunda mitad (Figura 3.).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 5).

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	19	-
Eliminación de <i>Acacia melanoxylon</i>	2	-
Eliminación de <i>Crocosmia × crocosmiiflora</i>	-	400
Eliminación de <i>Delairea odorata</i>	-	4
Eliminación de <i>Eucalyptus globulus</i>	1	-
Eliminación de <i>Ligustrum ovalifolium</i>	3	-
Eliminación de <i>Pinus pinaster</i>	1	-
Eliminación de <i>Tradescantia fluminensis</i>	-	18

Tabla 5. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-02-02.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores con ausencia de vegetación riparia de alto porte y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies

invasoras y/o alóctonas. Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se talen alisos afectados por *Phytophthora alni*, se procederá a la reposición de los árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior* y *Acer pseudoplatanus*.

La totalidad de la superficie a plantar es de 6074 m², lo que supone un 75% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 546 pies. En la Tabla 6 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie.

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 351 m² repartidos en parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.

FASE 2. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	1653	120	288	24	24	24
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	4421	60	4	2	-	-
TOTAL	6074	180	292	26	24	24

Tabla 6. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-02-02.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 5937 m², además con las plantaciones que se realizarán se producirá un incremento dicho hábitat en 2004 m².

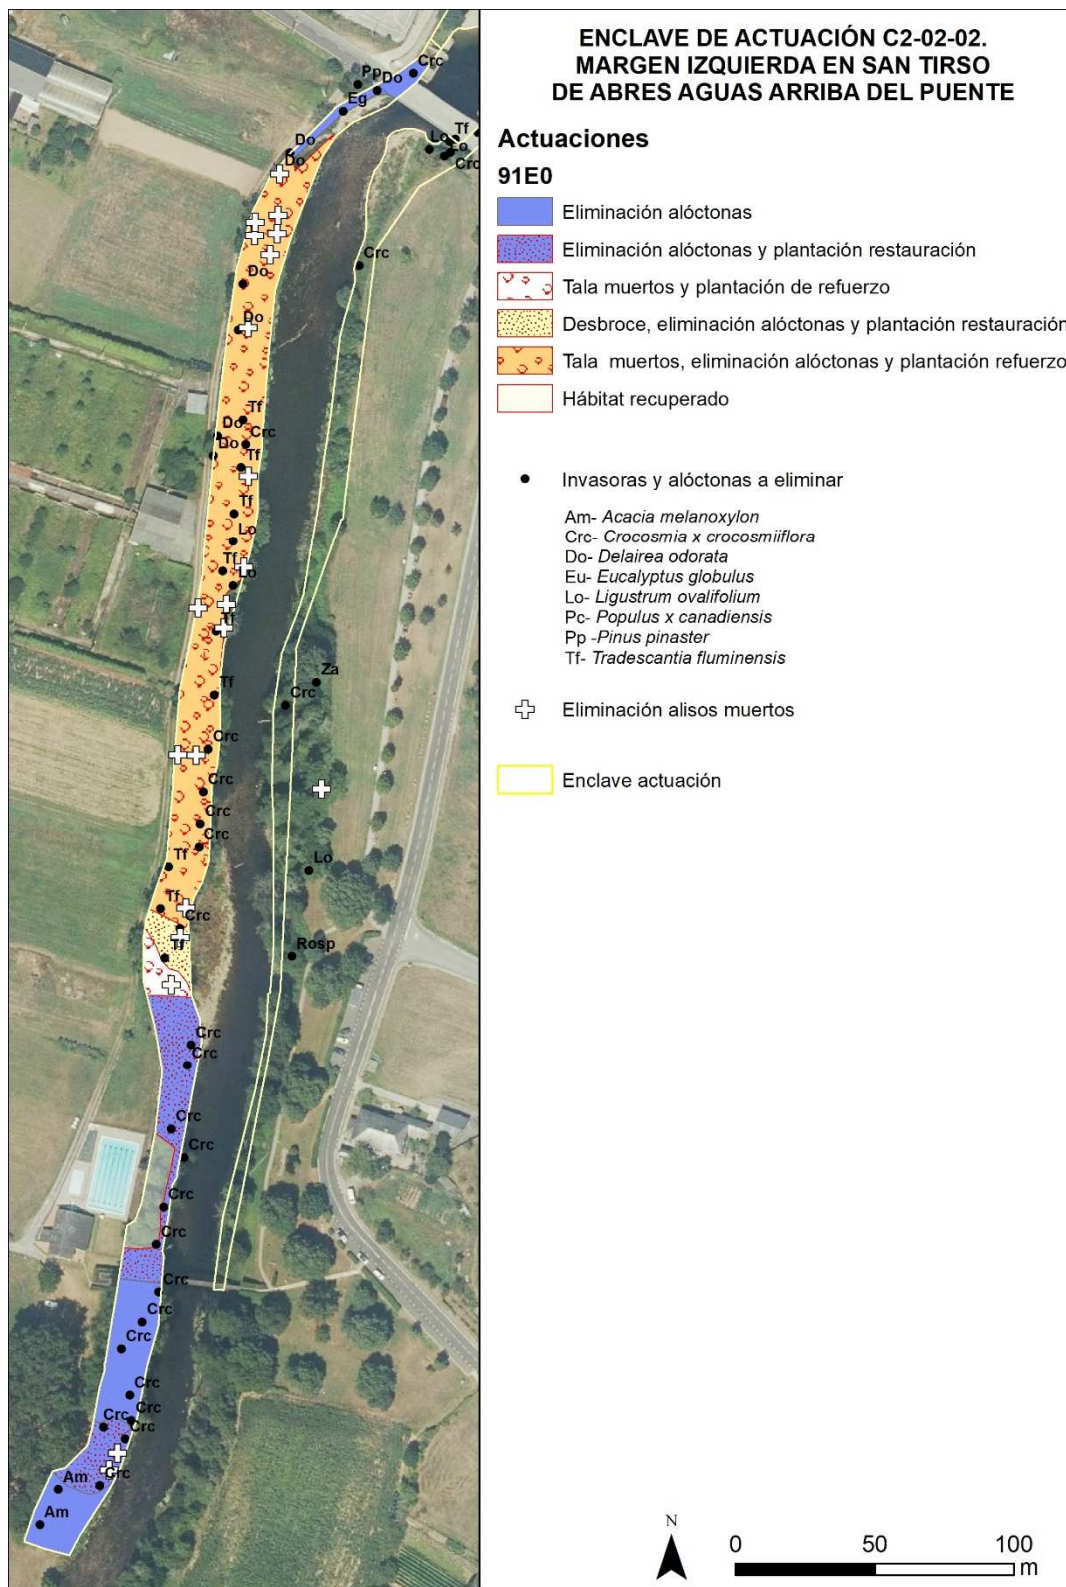


Figura 3. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-02-02.

5. ENCLAVE C2-02-03 MARGEN DERECHA EN SAN TIRSO DE ABRES

El enclave de actuación definido en la margen derecha del río Eo a su paso por San Tirso de Abres tiene una superficie de 3278 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 4).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 7).

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	1	-
Eliminación de invasora <i>Crocasmia × crocosmiiflora</i>	-	10
Eliminación de invasora <i>Ligustrum ovalifolium</i>	4	-
Eliminación de invasora <i>Tradescantia fluminensis</i>	-	45
Eliminación de invasora <i>Zantedeschia aethiopica</i>	1	-

Tabla 7. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-02-03.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana* (Tabla 8). Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en las zonas con ausencia de vegetación riparia de alto porte y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas de cara a mejorar la continuidad longitudinal del bosque de ribera. La totalidad de la superficie a plantar es de 900 m², lo que supone el 36% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 261 pies.

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 624 m² repartidos en pequeños parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	900	65	157	13	13	13

Tabla 8. Actuaciones de incremento del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-02-03.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 1741 m², además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat en 1524 m².

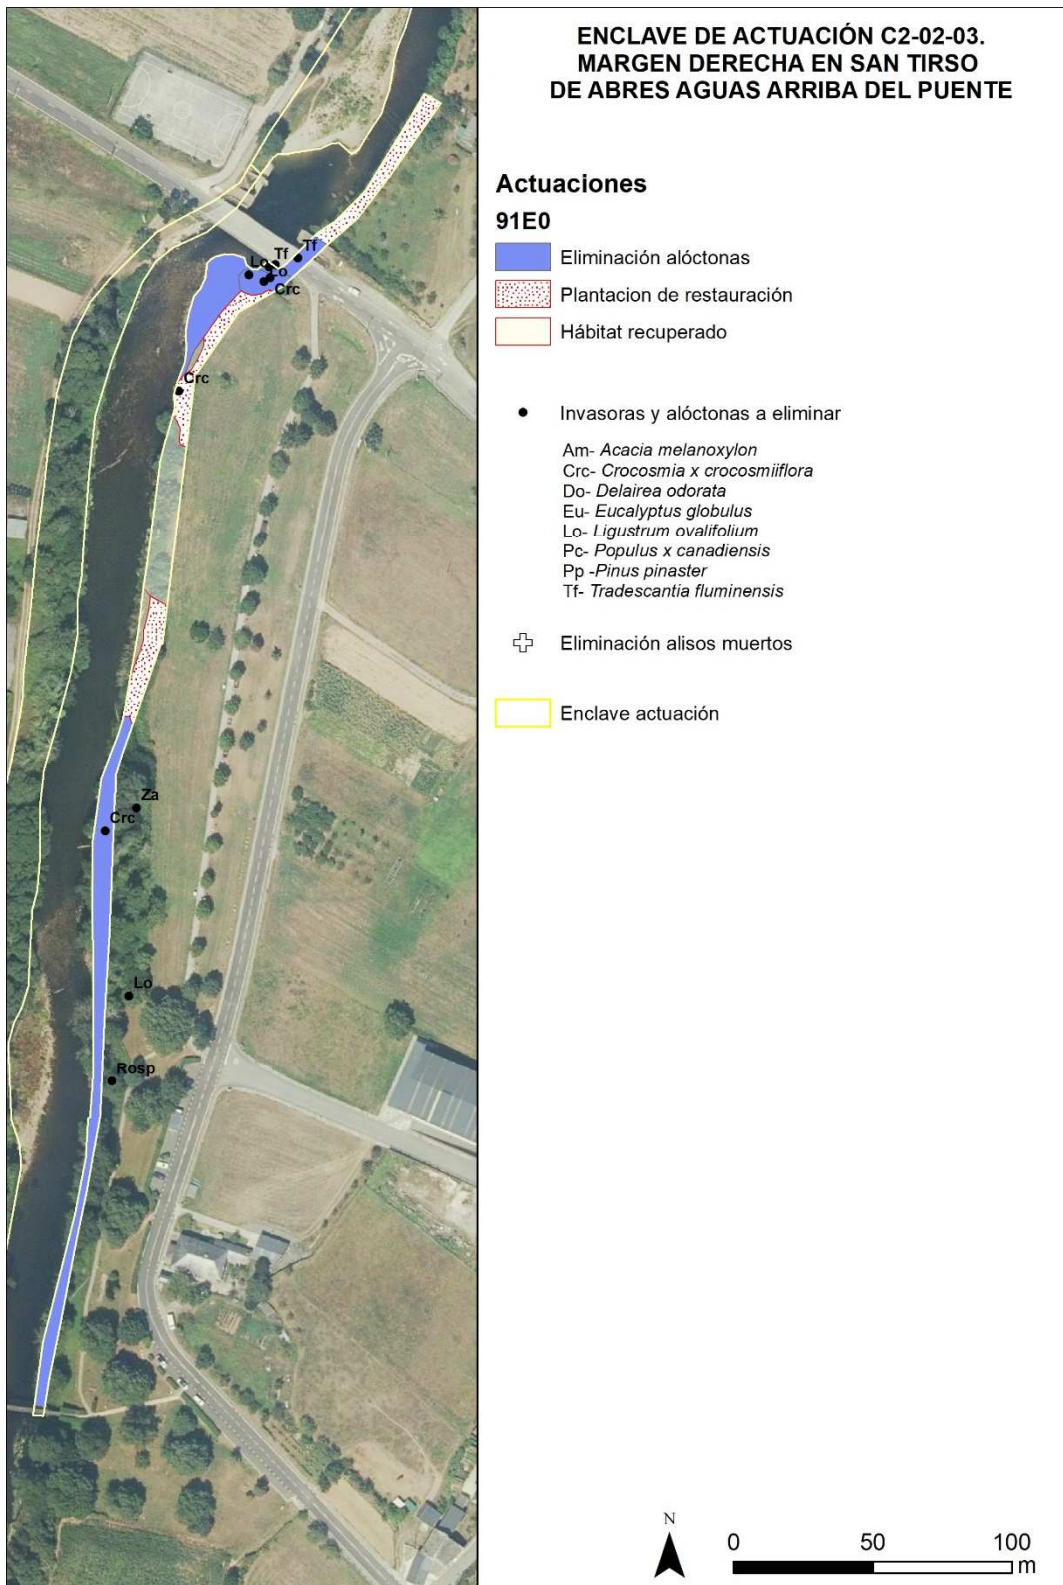


Figura 4. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-02-03.

6. ENCLAVES C2-03-01 Y C2-03-02 A PONTENOVA (BOULLOSO)

El enclave de actuación C2-03-01 definido en la margen izquierda del río Eo en el entorno de la depuradora de A Pontenova tiene una superficie de 1642 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 5.).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y alóctonas (Tabla 9), además en algunos sectores se llevará a cabo un desbroce y acondicionamiento del terreno para la posterior plantación.

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Eliminación de <i>Crocasmia × crocosmiiflora</i>	-	10

Tabla 9. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-03-01.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana* (Tabla 10). Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en: las zonas acondicionadas; en los sectores con ausencia de vegetación riparia de alto porte; y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas, todo ello de cara a mejorar la continuidad longitudinal del bosque de ribera.

La totalidad de la superficie a plantar es de 1035 m², lo que supone el 63% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 300 pies.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	1035	75	180	15	15	15

Tabla 10. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-03-01.

El enclave de actuación C2-03-02, ubicado en la margen derecha tiene una superficie de 2493 m² y, al igual que en el anterior, se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 5).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos, además en algunos sectores se llevará a cabo un desbroce y acondicionamiento del terreno para la posterior plantación (Tabla 11).

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	2	-
Eliminación de invasora <i>Buddleja davidii</i>	3	-

Tabla 11. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-03-02.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en las zonas con ausencia de vegetación riparia de alto porte. Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se talen alisos afectados por *Phytophthora alni*, se procederá a la reposición de los árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea* y *Fraxinus excelsior*. En la Tabla 12 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie.

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 403 m² repartidos en parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.


La totalidad de la superficie a plantar es de 2824 m², lo que supone casi el 72% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 418 pies.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	1416	103	246	21	21	21
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	373	6	1	-	-	-
TOTAL	1789	109	247	21	21	21

Tabla 12. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-03-02.

En el enclave de la margen izquierda (C2-03-01), las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas permitirán la mejora grado de conservación del hábitat 91E0* en 485 m², además con las plantaciones que se realizarán se producirá un incremento de dicho hábitat en 1035 m².

En el enclave de la margen derecha (C2-03-02) las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 615 m², además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat en 1819 m².

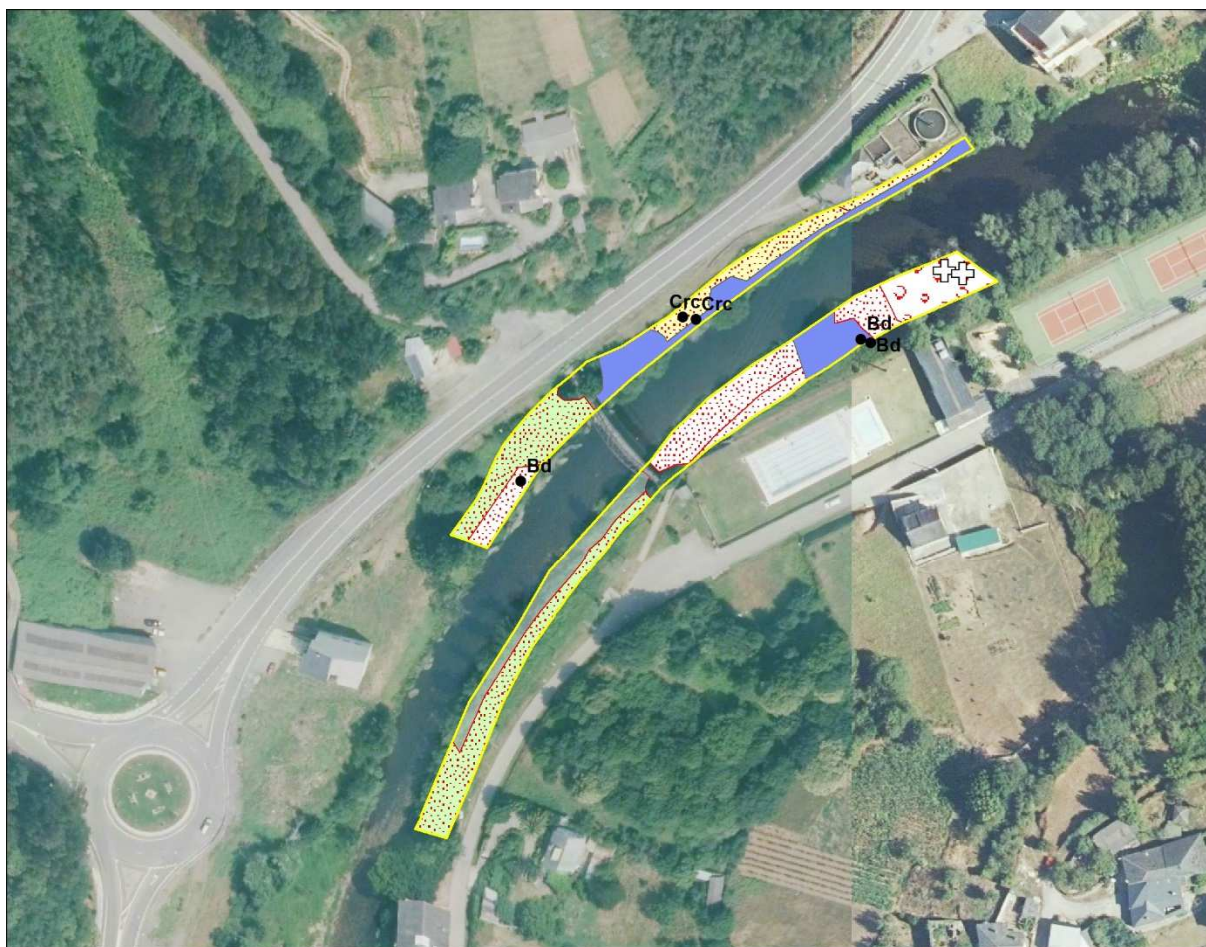

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-03-01 Y C2-03-02. A PONTENOVA (BOULLOSO)

Actuaciones

91E0

-  Eliminación alóctonas
-  Plantación de restauración
-  Tala muertos y plantación de refuerzo
-  Desbroce y plantación de restauración
-  Desbroce, eliminación alóctonas y plantación restauración
-  Hábitat recuperado

 Enclave actuación

- Invasoras y alóctonas a eliminar
Bd- *Buddleja davidii*
Crc- *Crocodylus x crocosmiiflora*

 Retirada de árboles muertos



Figura 5. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-03-01 y C2-03-02.

7. ENCLAVE C2-03-03 A PONTENOVA (PARQUE FLUVIAL)

El enclave de actuación definido en la margen derecha del río Eo a su paso por A Pontenova tiene una superficie de 4243 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 6).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas (Tabla 13) y se requerirá de un desbroce y acondicionamiento del terreno para poder llevar a cabo la posterior plantación en un pequeño sector de la parte inicial del enclave.

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)		
Actuaciones de eliminación de alóctonas	Uds	Superficie (m ²)
Eliminación de <i>Araucaria angustifolia</i>	1	-
Eliminación de <i>Crocasmia × crocosmiiflora</i>	-	6
Eliminación de <i>Ligustrum ovalifolium</i>	1	-
Eliminación de <i>Populus × canadensis</i>	2	-
Eliminación de <i>Rosa</i> sp.	1	-
Eliminación de <i>Salix babylonica</i>	1	-

Tabla 13. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-03-03.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en: las zonas acondicionadas; en los sectores con ausencia de vegetación riparia de alto porte; y en los sectores del enclave

compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas. La totalidad de la superficie a plantar es de 960 m², lo que supone casi un 23% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 278 pies (Tabla 14).

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 925 m² repartidos en pequeños parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	960	70	167	14	14	14

Tabla 14. Actuaciones de incremento del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-03-03.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 1718 m², además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento del mismo hábitat en 1885 m².



Figura 6. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-03-03.

8. ENCLAVE C2-04-01 ÁREA RECREATIVA FONDÓN (VILABOA-A PONTENOVA)

Este enclave de actuación tiene una superficie de 1842 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases en el año 2020, una en la primera mitad (Figura 7) y otra en la segunda mitad del año en periodo de aguas bajas.

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de un árbol muerto (Tabla 15).

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	1	-
Eliminación de invasora <i>Crocsmia × crocosmiiflora</i>	-	4

Tabla 15. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-04-01.

En la segunda fase se llevará a cabo la restauración mediante bioingeniería de la orilla del sector final del enclave, de unos 70 m de longitud. Como ya se indicó en el Proyecto técnico, el diseño de esta actuación se elaborará en otro documento en el que se establecerán los detalles concretos y necesarios para ejecutar la obra correctamente teniendo en cuenta la erosión de la orilla, así como el uso recreativo del enclave y para realizar las plantaciones tanto de refuerzo como de restauración.

Estas actuaciones permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 1187 m² y un incremento del mismo en 655 m².

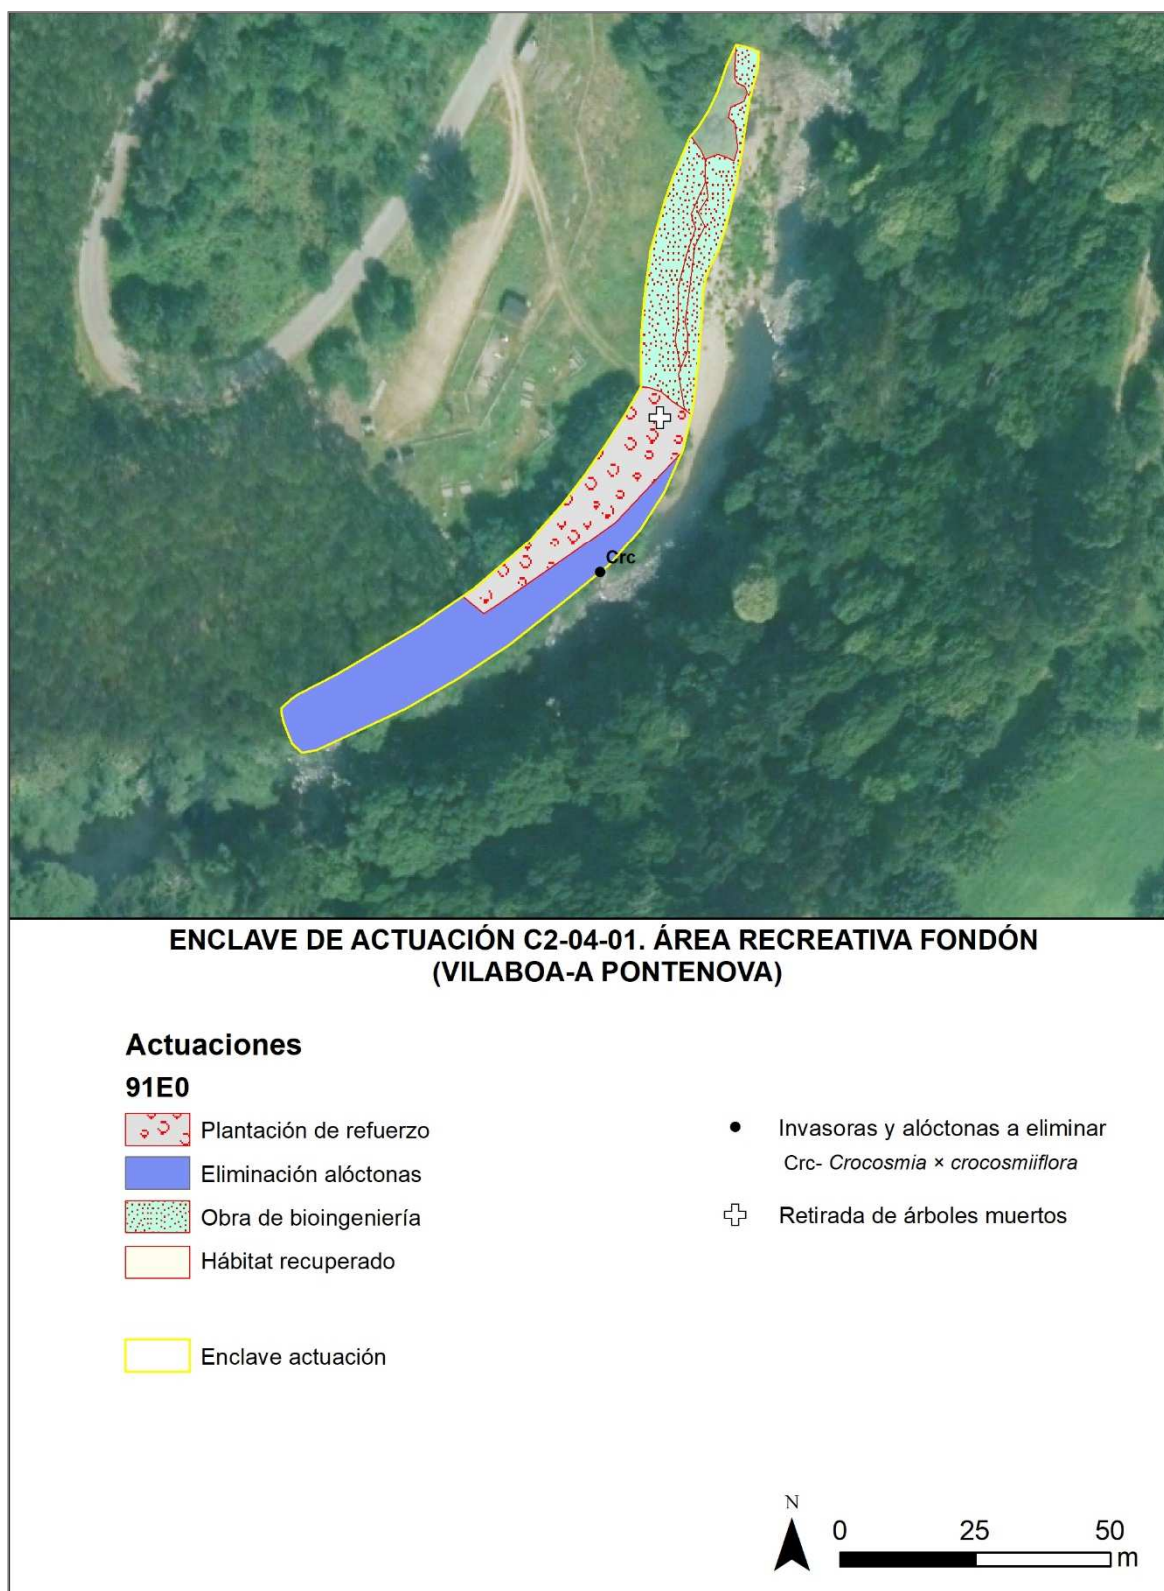


Figura 7. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-04-01.

9. ENCLAVE C2-05-01 MEIRA (AGUAS ABAJO O PIÑEIRO)

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por el municipio de Meira tiene una superficie de 14697 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 8).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 16). Estas actuaciones se realizarán a lo largo de toda la superficie del enclave.

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	41	-
Eliminación de invasora <i>Crocasmia</i> × <i>crocosmiiflora</i>	-	30
Eliminación de invasora <i>Eucalyptus globulus</i>	4	1129
Eliminación de invasora <i>Prunus laurocerasus</i>	5	-

Tabla 16. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-05-01.

Los individuos de *Eucalyptus globulus* se han cuantificado en superficie, haciendo referencia al eucaliptal que hay al inicio del enclave y como número de individuos, para cuatro árboles que hay repartidos a lo largo del resto del enclave.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos

inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas, de cara a mejorar la continuidad longitudinal del bosque de ribera.


Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se talen alisos afectados por *Phytophthora alni*, se procederá a la reposición de los árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior* y *Acer pseudoplatanus*.

En la Tabla 17 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie y para cada tipo de plantación. Se va a plantar en la totalidad del enclave, requiriéndose un total de 459 pies.

FASE 2. AÑO 2020 (primer SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	1129	82	196	16	16	16
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	13575	120	8	4	-	-
TOTAL	14704	202	204	20	16	16

Tabla 17. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-05-01.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 13575 m², además con las plantaciones que se realizarán se producirá un incremento del mismo en 1129 m².

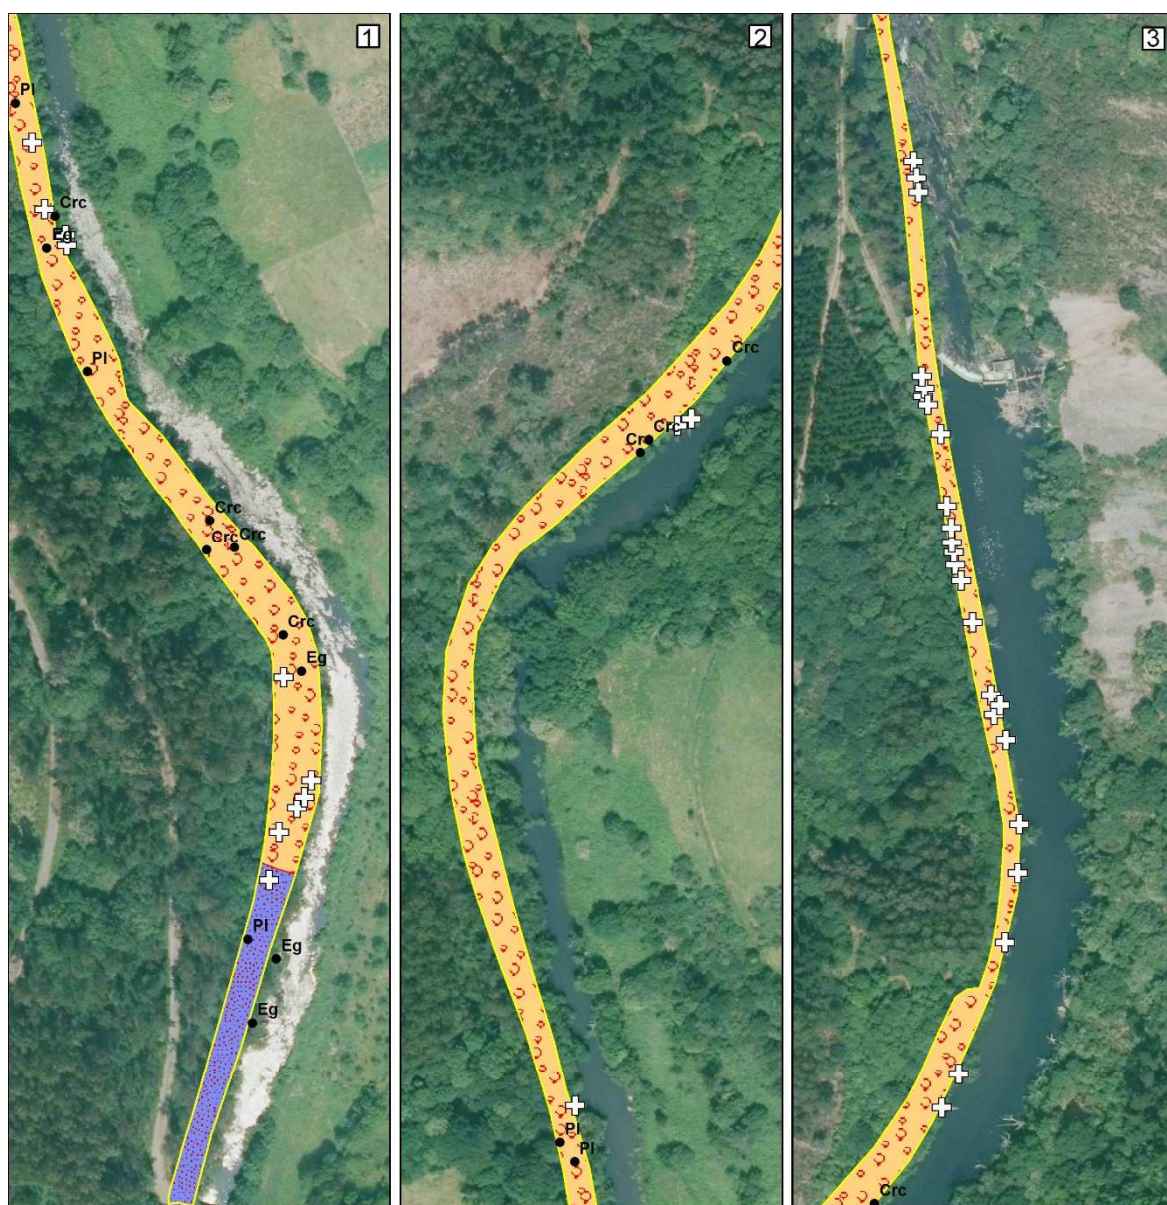

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-05-01. MEIRA (AGUAS ABAJO O PIÑERO). Mapa 1 de 2

Actuaciones

91E0

-  Eliminación de alóctonas y plantación restauración
-  Tala muertos, eliminación alóctonas y plantación refuerzo

- Invasoras y alóctonas a eliminar
 Crc- *Crocodylus x crocosmiiflora*
 Eg- *Eucalyptus globulus*
 Pl- *Prunus laurocerasus*

- ⊕ Eliminación alisos muertos

 Enclave actuación







Figura 8. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-05-01.

10. ENCLAVE C2-05-02 MEIRA (AGUAS ARRIBA O PIÑEIRO)

El enclave de actuación definido en la margen derecha del río Eo a su paso por el municipio de Meira tiene una superficie de 13791 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 9).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 18).

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	37	-
Eliminación de <i>Acacia melanoxylon</i>	1	-
Eliminación de <i>Crocasmia × crocosmiiflora</i>	-	110
Eliminación de <i>Eucalyptus globulus</i>	2	129
Eliminación de <i>Prunus laurocerasus</i>	2	-

Tabla 18. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-05-02.

Los individuos de *Eucalyptus globulus* se han cuantificado en superficie, dentro de la cual se incluye el eucaliptal que hay al inicio del enclave y como número de individuos, para dos árboles que hay a lo largo del enclave.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas para incrementar el hábitat 91E0*.


Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se eliminen invasoras y se talen alisos afectados por *Phytophthora alni*, se procederá a la reposición de los árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior* y *Acer pseudoplatanus*. En la Tabla 19 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie.

La totalidad de la superficie a plantar es de 13339 m², lo que supone prácticamente un 97% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 216 pies.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	288	21	50	4	4	4
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	13051	120	8	4	-	-
TOTAL	13339	141	58	8	4	4

Tabla 19. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-05-02.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 13051 m², además con las plantaciones que se realizarán se producirá un incremento del mismo en 288 m².

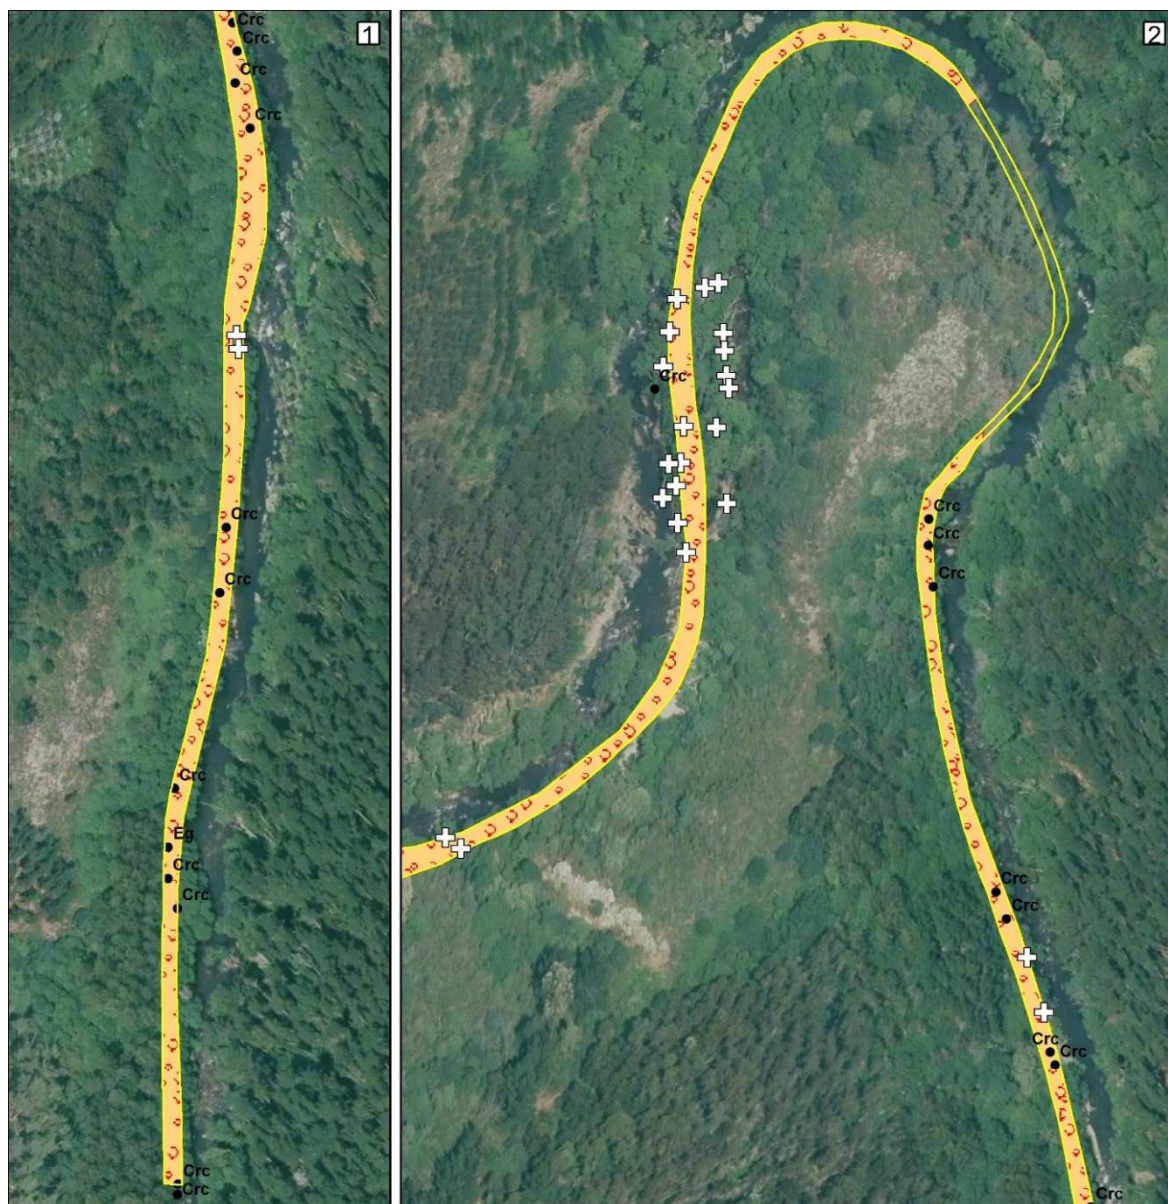

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-05-02. MEIRA (AGUAS ARRIBA O PIÑEIRO). Mapa 1 de 2

Actuaciones

91E0


 Tala muertos, eliminación alóctonas y plantación refuerzo

- Invasoras y alóctonas a eliminar

Crc- *Crocosmia x crocosmiiflora*
Eg- *Eucalyptus globulus*

 Eliminación alisos muertos

 Enclave actuación



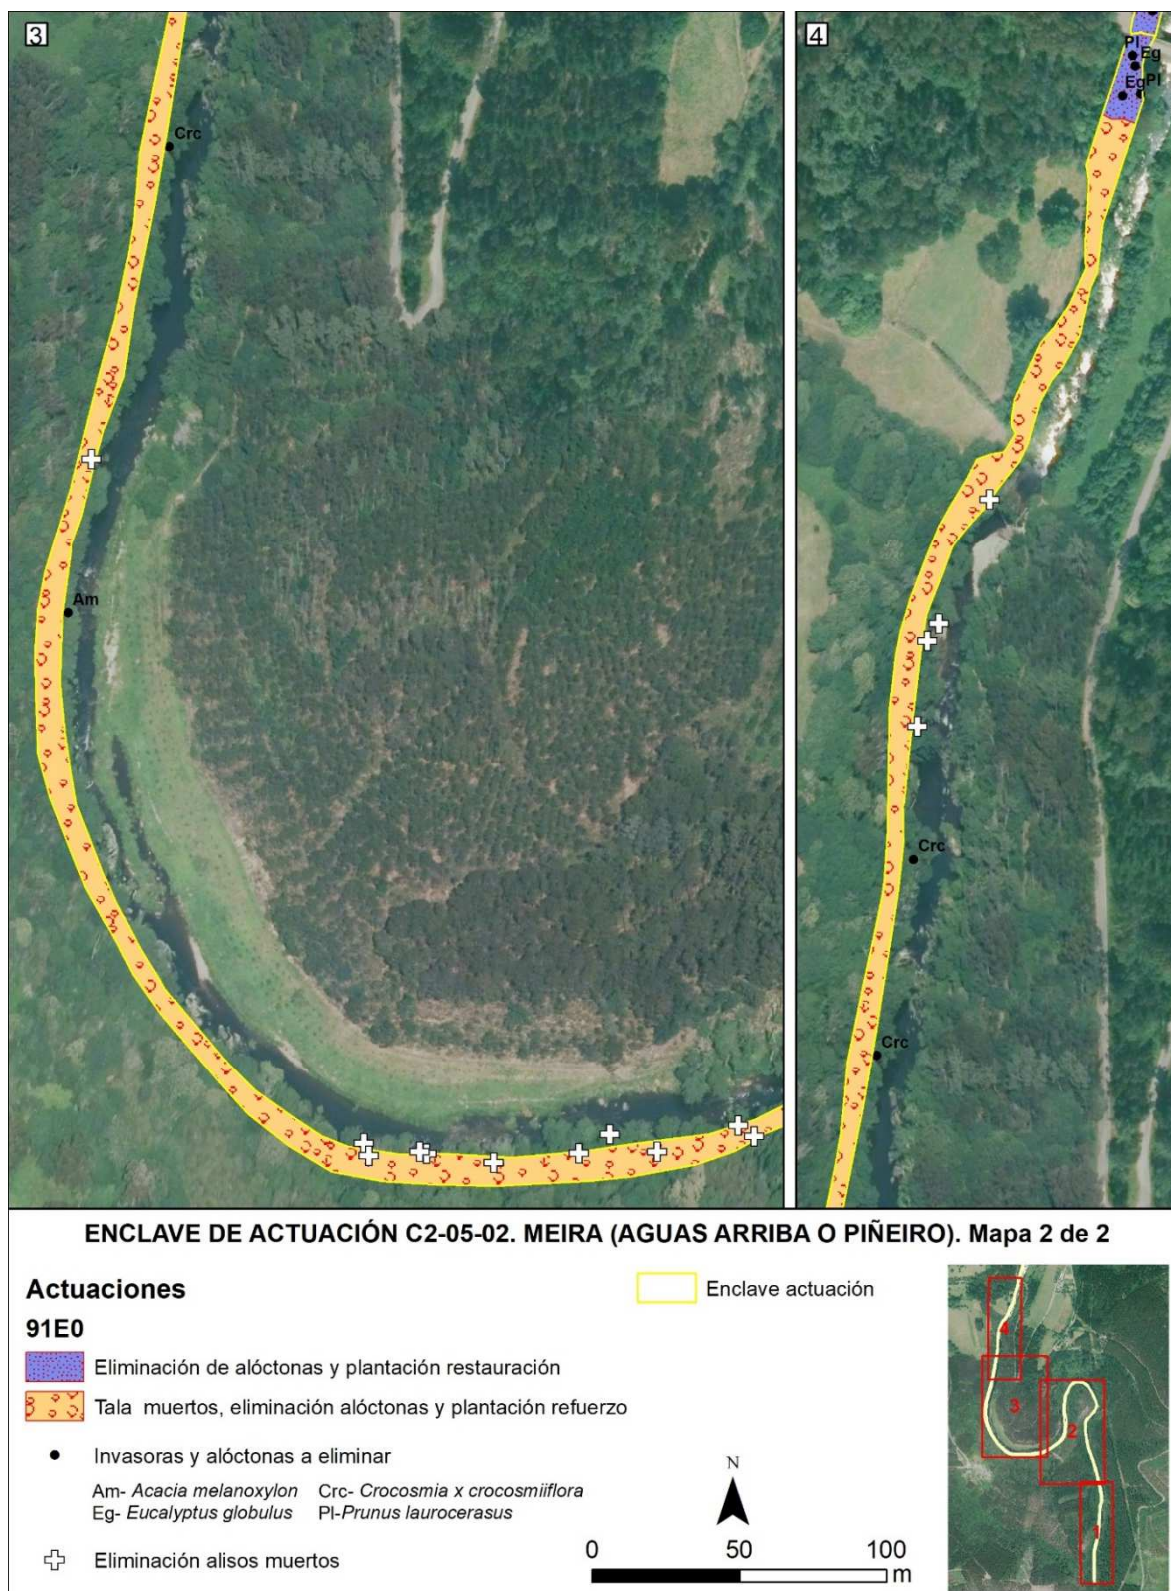


Figura 9. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-05-02.

11. ENCLAVE C2-06-01 RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN DERECHA)

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por el municipio de Ribeira de Piquín tiene una superficie de 27735 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 10).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 20).

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	292	-
Eliminación de <i>Crocosmia</i> × <i>crocosmiiflora</i>	-	85
Eliminación de <i>Eucalyptus globulus</i>	9	-
Eliminación de <i>Eucalyptus obliqua</i>	1	-
Eliminación de <i>Populus</i> × <i>canadensis</i>	5	-
Eliminación de <i>Vinca minor</i>	1	-

Tabla 20. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-06-01.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas para incrementar el hábitat 91E0*.

Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se eliminan invasoras y se talen alisos afectados por *Phytophthora alnii*, se procederá a la reposición de los


árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior* y *Acer pseudoplatanus*. En la Tabla 21 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie. La totalidad de la superficie a plantar es de 27185 m², lo que supone un 98% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 1088 pies.

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 645 m² repartidos en parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	421	30	73	6	6	6
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	26764	876	60	30	-	-
TOTAL	27185	906	133	36	6	6

Tabla 21. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-06-01.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora del hábitat 91E0* en 26655 m², además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat en 1065 m².

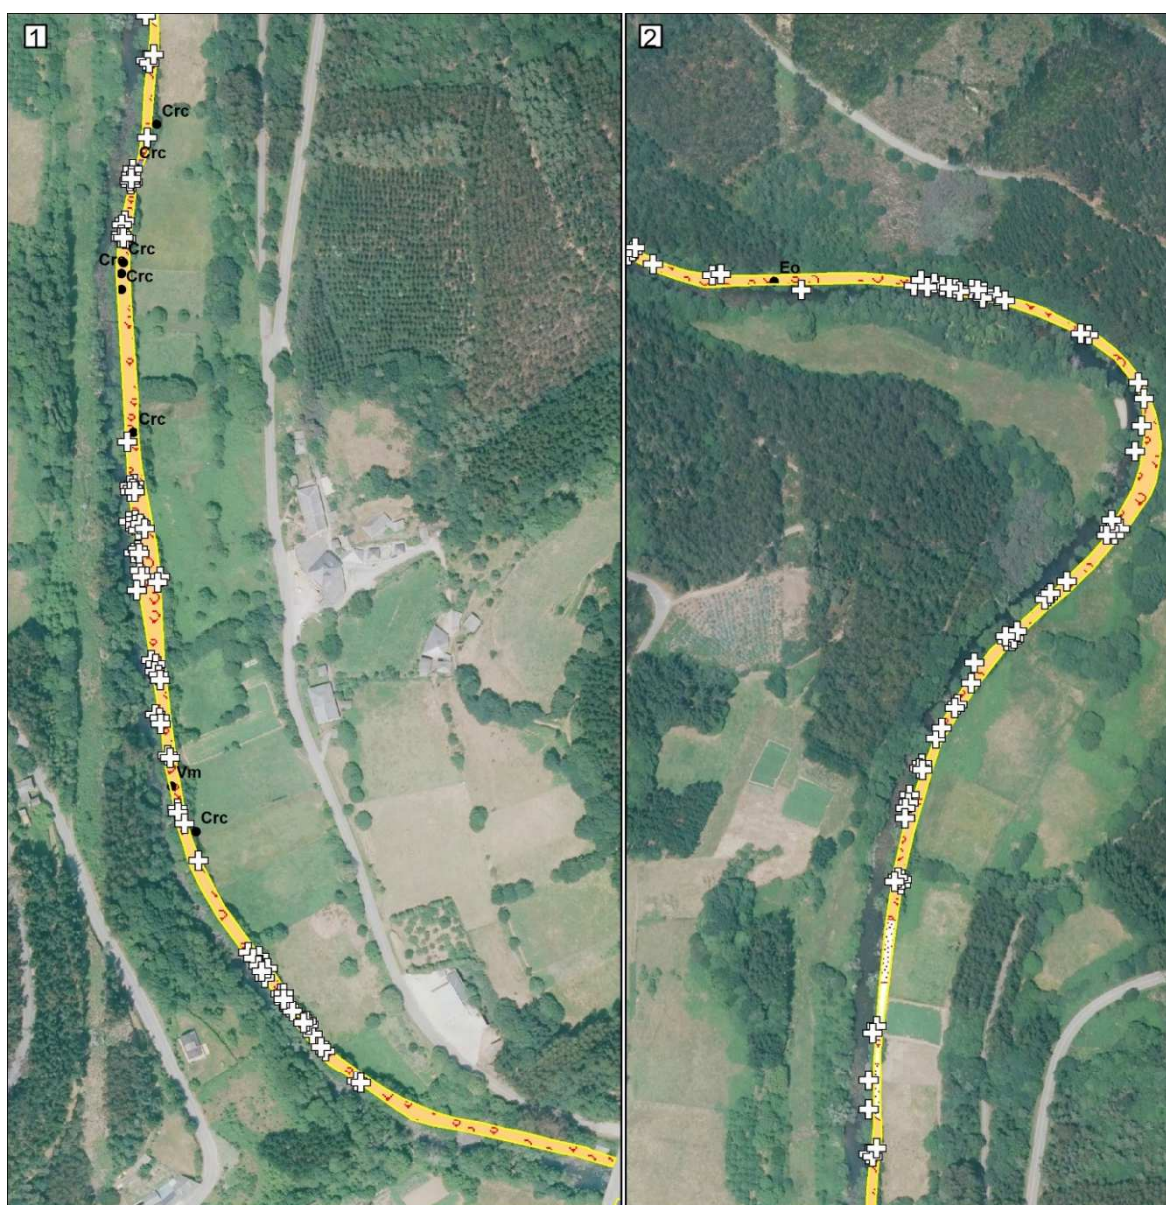

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-06-01. RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN DERECHA) Mapa 1 de 3

Actuaciones

91E0


-  Plantación de restauración
-  Tala muertos y plantación de refuerzo
-  Tala muertos, eliminación alóctonas y plantación refuerzo


- Invasoras y alóctonas a eliminar

Crc- *Crocsmia x crocosmiiflora*

- ⊕ Eliminación alisos muertos

 Enclave actuación



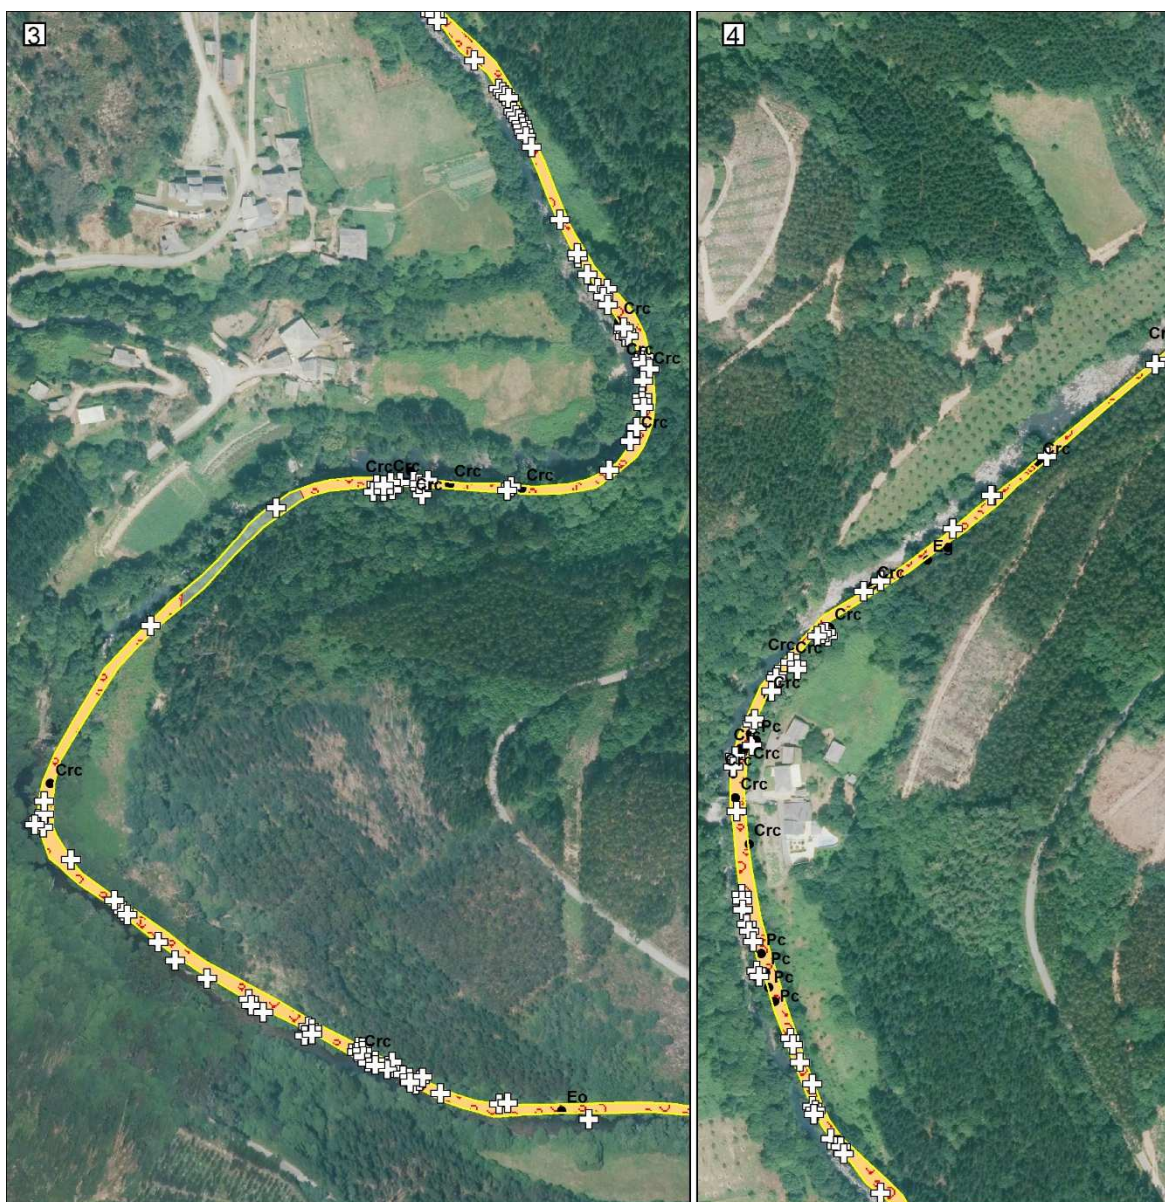

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-06-01. RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN DERECHA) Mapa 2 de 3

Actuaciones

91E0

 Tala muertos, eliminación alóctonas y plantación refuerzo

 Hábitat recuperado

- Invasoras y alóctonas a eliminar

Crc- *Crocasmia x crocosmiiflora*

Eg- *Eucalyptus globulus*

Eo- *Eucalyptus obliqua*

Pc- *Populus x canadensis*

 Eliminación alisos muertos

 Enclave actuación







Figura 10. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-06-01.

12. ENCLAVE C2-06-02 RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN IZQUIERDA)

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por el municipio de Ribeira de Piquín tiene una superficie de 23400 m² y se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 11).

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 22).

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)		
Actuaciones	Uds	Superficie (m ²)
Retirada de árboles muertos	206	-
Eliminación de <i>Crocasmia × crocosmiiflora</i>	-	25
Eliminación de <i>Cyperus eragostis</i>	1	-
Eliminación de <i>Eucalyptus globulus</i>	-	120
Eliminación de <i>Populus × canadensis</i>	6	-
Eliminación de <i>Prunus laurocerasus</i>	1	-
Eliminación de <i>Vinca minor</i>	1	-

Tabla 22. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-06-02.

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*, *Laurus nobilis* y *Corylus avellana*. Se plantará, mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas para incrementar el hábitat 91E0*.


Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se eliminan invasoras y se talen alisos afectados por *Phytophthora alni*, se procederá a la reposición de los árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* *Salix atrocinerea*, *Fraxinus excelsior* y *Acer pseudoplatanus*. En la Tabla 23 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie. La totalidad de la superficie a plantar es de 27185 m², lo que supone un 98% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 1088 pies.

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 565 m² repartidos en pequeños parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat.

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE)						
PLANTACIÓN	Superficie (m ²)	Plantaciones (nº de individuos)				
		<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Corylus avellana</i>
De restauración (incremento del hábitat 91E0*)	685	50	119	10	10	10
De refuerzo (mejora del hábitat 91E0*)	21740	618	40	20	-	-
TOTAL	22425	668	159	30	10	10

Tabla 23. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-06-02.

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora del hábitat 91E0* en 21740 m², además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat en 1250 m².

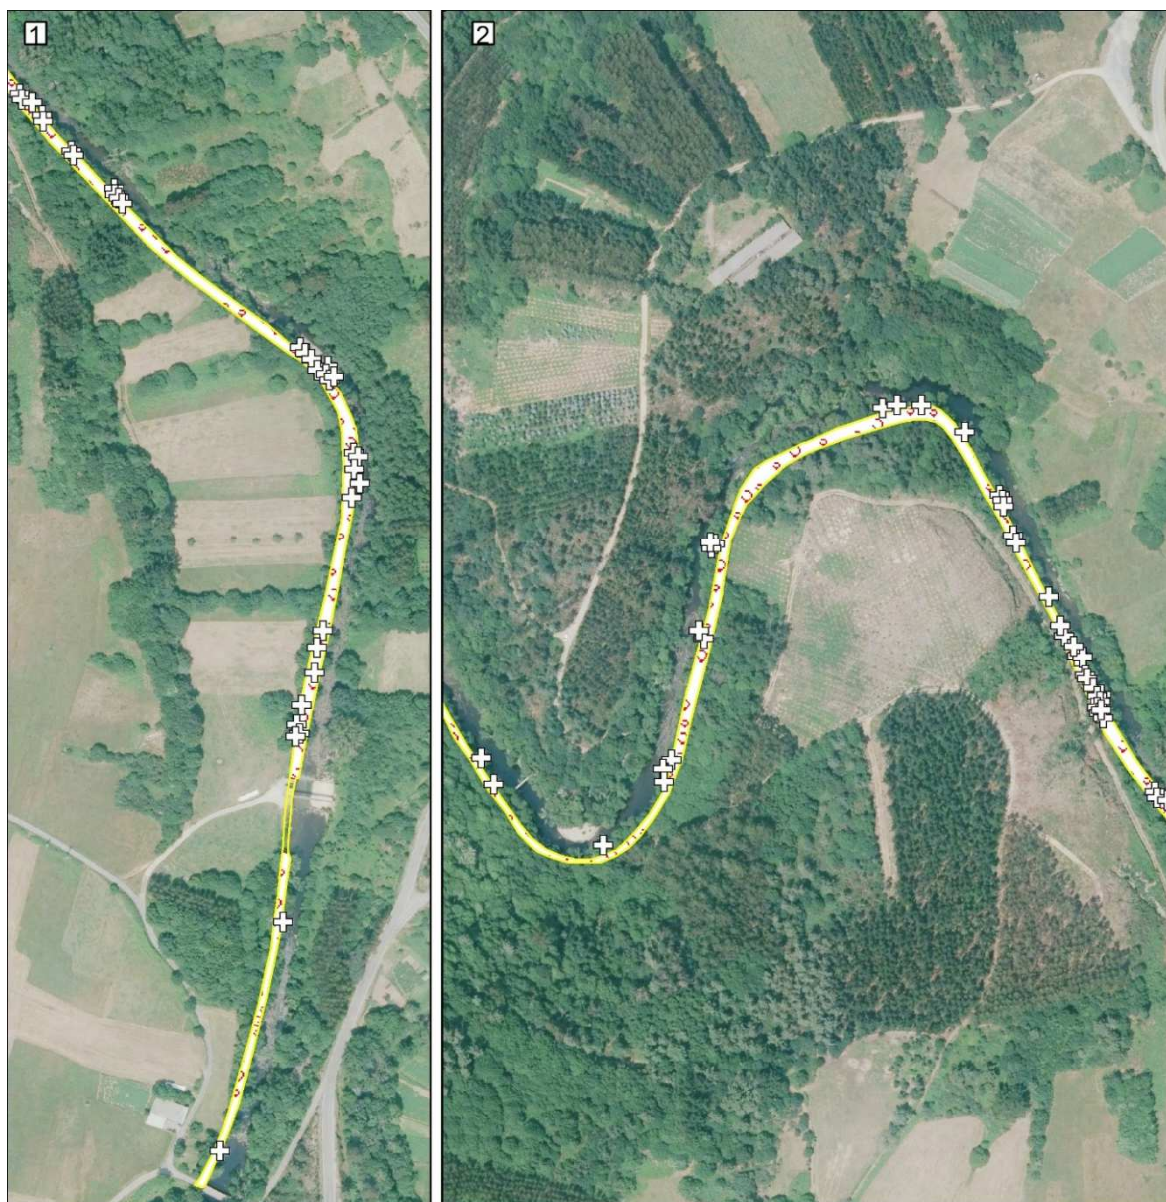

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-06-02. RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN IZQUIERDA). Mapa 1 de 3



Actuaciones


91E0

 Tala muertos y plantación de refuerzo

 Eliminación alisos muertos

 Enclave actuación



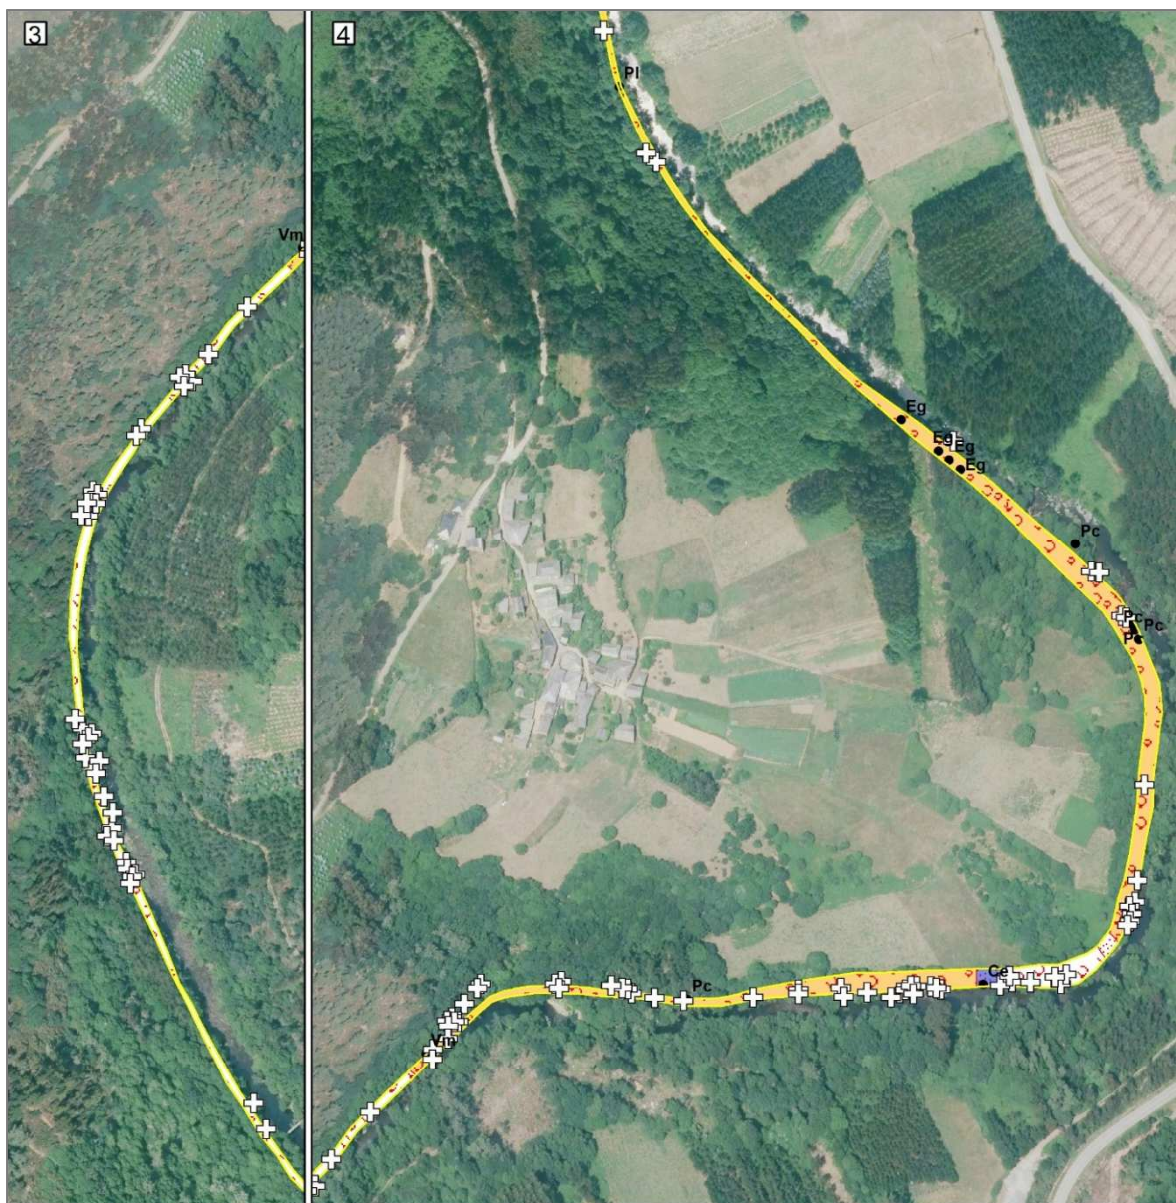

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-06-02. RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN IZQUIERDA). Mapa 2 de 3



Actuaciones


91E0

-  Plantación de restauración
-  Eliminación de alóctonas y plantación restauración
-  Tala muertos y plantación de refuerzo
-  Tala muertos, eliminación alóctonas y plantación refuerzo
-  Enclave actuación

- Invasoras y alóctonas a eliminar
 Ce- *Cyperus eragrostis*
 Pc- *Populus x canadensis*
 Pl- *Prunus laurocerasus*

- + Eliminación alisos muertos



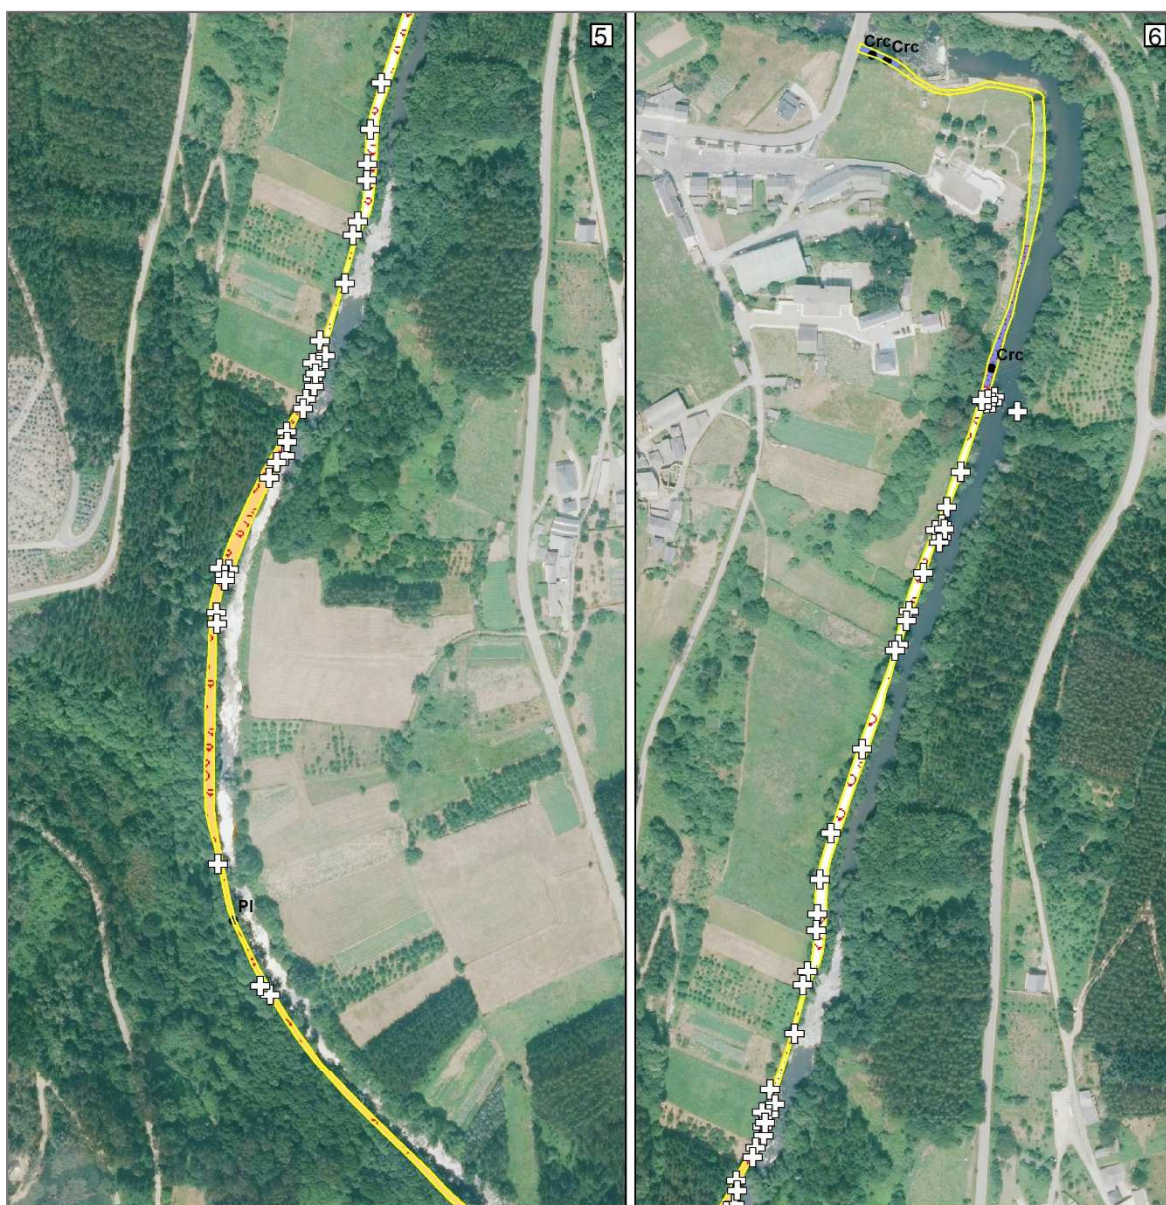

ENCLAVE DE ACTUACIÓN C2-06-02. RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN IZQUIERDA). Mapa 3 de 3

Actuaciones

91E0

-  Eliminación alóctonas
-  Plantación de restauración
-  Eliminación alóctonas y plantación restauración
-  Tala muertos y plantación de refuerzo
-  Tala muertos, eliminación alóctonas y plantación refuerzo
-  Hábitat recuperado

- Invasoras y alóctonas a eliminar
Crc- *Crocasmia x crocosmiiflora*
PI- *Prunus laurocerasus*
- + Eliminación alisos muertos

 Enclave actuación





Figura 11. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-06-02.

13. SÍNTESIS

Con las actuaciones descritas en cada uno de los enclaves que se desarrollarán entre los años 2019 y 2020 se logrará un incremento de 1,2 ha del hábitat 91E0* y una mejora de 9,3 ha del mismo en la acción de conservación C2 *Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023)*.

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EN LA ACCIÓN C2			
ENCLAVE DE ACTUACIÓN		SUPERFICIE HÁBITAT 91E0* (ha)	
Código	Nombre	INCREMENTO	MEJORA
C2-01-01	Isla fluvial en Vegadeo	0,03	0,05
C2-02-01	Margen izquierda en San Tirso de Abres	0,27	0,74
C2-02-02	Margen izquierda en San Tirso de Abres hasta el puente	0,20	0,59
C2-02-03	Margen derecha en San Tirso de Abres	0,15	0,17
C2-03-01	A Pontenova (Bouloso) margen izquierda	0,10	0,05
C2-03-02	A Pontenova (Bouloso) margen derecha	0,18	0,06
C2-03-03	A Pontenova (parque fluvial)	0,19	0,17
C2-04-01	Área recreativa Fondón (Vilaboa-A Pontenova)	0,07	0,12
C2-05-01	Meira (aguas abajo de O Piñeiro)	0,11	1,36
C2-05-02	Meira (aguas arriba de O Piñeiro)	0,03	1,31
C2-06-01	Ribeira de Piquín (Margen derecha)	0,11	2,67
C2-06-02	Ribeira de Piquín (Margen izquierda)	0,13	2,17
TOTAL ACCIÓN C2		1,57	9,46

Tabla 24. Superficies de incremento y mejora de hábitat 91E0* en los enclaves de actuación de la acción C2.



life fluvial

MEJORA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE CORREDORES FLUVIALES DE LA REGIÓN ATLÁNTICA IBÉRICA



SOCIOS/PARCEIROS/SOCIOS/PARTNERS

